



รายงานผลการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ
(โขง ชี มูล)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ก่อนการดำเนินการ

คำนำ

รายงานผลการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๖ ที่กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ประสาน เร่งรัด และติดตามการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๓) ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เพื่อประสานส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมถึงกำกับและติดตามการบริหารโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการประเมินผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ออกนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ก่อนการดำเนินโครงการ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

ในการนี้ คณะทำงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการกำกับและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

คณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	
๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑
๑.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปี	๒
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ก่อนการดำเนินการ	
๒.๑ จังหวัดศรีสะเกษ	๓
๒.๒ จังหวัดอุบลราชธานี	๑๑
๒.๓ จังหวัดยโสธร	๑๙
๒.๔ จังหวัดอำนาจเจริญ	๒๕
ภาคผนวก	๓๑

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๒๘๕,๐๗๒,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๒๖,๕๙๗,๓๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
๒	โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	๓,๕๒๓,๓๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
๓	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	๒,๗๖๖,๖๐๐	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำ	๓๔,๓๙๘,๐๐๐	โครงการชลประทานศรีสะเกษ
๕	โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงอาเซียน	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
๖	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์	๗๔,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงอุบลราชธานี ๑
๗	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว	๑๑,๒๕๓,๗๐๐	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัด
๘	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อการท่องเที่ยว	๑๐๖,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทบราซธานี แขวงทางหลวงยโสธร
๙	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	๑,๒๑๙,๙๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ในกลุ่มจังหวัด
๑๐	"โครงการซ่อมแซมศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง	๙,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ	๖,๓๑๓,๒๐๐	สำนักงานแรงงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ในกลุ่มจังหวัด
๑๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ	๕,๐๐๐,๐๐๐	จังหวัดในกลุ่มจังหวัด

**โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี**

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๙๑๕,๙๕๒ บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี	หน่วยดำเนินการ
จังหวัดอุบลราชธานี			
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๑๓,๐๑๔,๔๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
๒	โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป	๒,๔๔๑,๙๕๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดศรีสะเกษ			
๓	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๖๔๒,๘๘๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
๔	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอนกันทรลักษณ์ - กันทรามย์ ระหว่าง กม. ๓+๒๐๐ - กม. ๔+๗๐๐	๑๓,๗๒๐,๙๔๒	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
๕	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงถนนและอำนวยความสะดวก สาย ศก. ๔๐๐๓ แยก ทล.๒๐๗๖ - บ้านห้วยทับทัน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์, ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นช่วงๆ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๑๖๖ กิโลเมตร)	๒๙,๙๙๒,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
จังหวัดยโสธร			
๖	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๑,๕๓๓,๑๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๗	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๗ ตอนควมคุม ๐๑๐๐ ตอนโรงพยาบาลยโสธร - ตอนมะยาง ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๑+๗๓๒	๓๖,๕๕๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงยโสธร
จังหวัดอำนาจเจริญ			
๘	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๙๖๕,๐๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
๙	โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป	๓๖๐,๐๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
๑๐	โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	๑,๖๙๕,๖๘๐	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ



สรุปผลการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ณ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

กำหนดการ

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ก่อนการดำเนินการ

ณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะทำงานฯ เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ไปยังศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ

ณ ห้องประชุมสระแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ติดตามผลการดำเนินโครงการ ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรม ปรับปรุงถนนและอำนวยความสะดวก

สาย ศก. ๔๐๐๓ แยก ทล.๒๐๗๖ - บ้านห้วยทับทัน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์,
ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นช่วง ๆ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๑๑๖ กิโลเมตร

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ

๒. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ ๓,๑๑๗,๕๕๐ บาท

(กลุ่มปลูกหม่อนไหมบ้านไฮ “ผ้าศรีลาวา” หมู่ที่ ๖ ตำบลตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ)

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ หน่วยดำเนินการ : สนง.เกษตรจังหวัด , สนง.ประมง จังหวัด , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	๔,๔๔๙,๕๐๘	-	๔,๔๔๙,๕๐๘	
๒	โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สินค้าเกษตรแปรรูป หน่วยดำเนินการ : สนง.เกษตรจังหวัด	๕๘๖,๘๐๐	-	๖๘๖,๘๐๐	
๓	โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืน ในการบริหารจัดการน้ำ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บลำห้วยคล้า ระยะที่ ๑ ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ๑ แห่ง หน่วยดำเนินการ : โครงการชลประทานศรีสะเกษ	๓๔,๓๙๘,๐๐๐	-	๓๔,๓๙๘,๐๐๐	
๔	โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุน ของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน หน่วยดำเนินการ : สนง.พาณิชย์จังหวัด	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว หน่วยดำเนินการ : สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	๓,๑๑๗,๕๕๐	-	๓,๑๑๗,๕๕๐	
๖	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ หน่วยดำเนินการ : สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	๑๓๓,๒๕๐	-	๑๓๓,๒๕๐	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับสังคมสูงอายุ หน่วยดำเนินการ : สนง.แรงงานจังหวัดและสถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ	๑,๘๓๔,๕๗๕	๑๘๔,๔๐๐	๑,๖๕๐,๑๗๕	
๘	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ หน่วยดำเนินการ : สนง.ศรีสะเกษ	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	
	รวม	๔๖,๐๑๙,๖๘๓	๑๘๔,๔๐๐	๔๕,๘๓๕,๒๘๓	

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือปี)
ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ กันเงินไว้เบิก เหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๖๔๒,๘๘๐	๓๘๕,๗๒๘	๒๕๗,๑๕๒	มีแผนดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (ตรวจรับรอง มาตรฐาน)
๒	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรม ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอนกันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม. ๓+๒๐๐ - กม. ๔+๗๐๐	๑๓,๗๒๐,๙๔๒	๑๓,๗๒๐,๙๔๒	-	
๓	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบ คมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงถนนและอำนวยความสะดวก สาย ศก. ๔๐๐๓ แยก ทล.๒๐๗๖ - บ้านห้วยทับทัน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์, ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นช่วงๆ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๑๑๖ กิโลเมตร	๒๙,๙๙๒,๐๐๐	-	๒๙,๙๙๒,๐๐๐	อยู่ระหว่าง การตรวจรับงาน งวดสุดท้าย
รวม		๔๔,๓๕๕,๘๒๒	๑๔,๑๐๖,๖๗๐	๓๐,๒๔๙,๑๕๒	

การประชุมนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ

ณ ห้องประชุมสระแพ่งใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ



คณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ที่ได้กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี) พบว่า โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในระหว่างการเริ่มต้นดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณจึงยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากบางโครงการยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ บางโครงการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) โดยกลุ่มจังหวัดฯ จะกำหนดให้มีการประชุมในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากออกไปก่อน เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ โดยส่วนราชการผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้ว สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแผนดำเนินกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๓ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงถนนและอำนวยความสะดวก สาย ศก. 4003 แยก ทล.2076 - บ้านห้วยทับทัน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์, ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นช่วง ๆ ระยะทาง 5.116 กิโลเมตร อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงานงวดสุดท้าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นการขอเงิน ว่างเบิกเหลื่อมปีให้ทันภายในกำหนดเวลาที่ขอเงินว่างเบิก หากมีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลัง เวลาดังกล่าว ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน ซึ่งในกรณีนี้ได้กำชับให้สำนักงานจังหวัดได้กำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการขอเงินว่างเบิกเหลื่อมปีโดยเคร่งครัด และกำชับ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ รวมถึงกำชับ ให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินโครงการทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จด้วย

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ
ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ

๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม ปรับปรุงถนนและอำนวยความสะดวกสาย ศก. ๔๐๐๓ แยก ทล.๒๐๗๖ – บ้านห้วยทับทัน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์, ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นช่วงๆ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๑๑๖ หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ



จากการนิเทศติดตาม พบว่า โครงการดังกล่าวสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่การดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือการตรวจรับงานงวดสุดท้าย ในกรณี คณะทำงานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำชับให้หน่วยดำเนินการให้ความสำคัญกับการพิจารณากำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตรา ร้อยละ ๐ ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมถึงกำชับให้เบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นการขอเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปี ให้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้แนะนำให้หน่วยดำเนินการจัดให้มีการประเมิน ประสิทธิภาพของโครงการเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จด้วย

๒. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ



คณะทำงานฯ ได้เนิเทศและติดตามฯ ณ กลุ่มปลูกหม่อนไหมบ้านไฮ เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลตุม
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า กลุ่มปลูก หม่อนไหมบ้านไฮ ผลิตผ้าทอ ภายใต้ชื่อ “ผ้าศรีลาวา”
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Quadrant) ระดับ D และมีผลการคัดสรรดาวประจำปี ๒๕๖๒ ระดับ ๔ ดาว มีสมาชิก
ทั้งหมด ๓๐ คน ซึ่งกลุ่มทอผ้ามีทั้งหมด ๒๖ กลุ่ม ซึ่งมีอยู่หลากหลายหมู่บ้านและหลายตำบล ได้รับการสนับสนุน
จากกลุ่มหม่อนไหมจังหวัดศรีสะเกษและมีการยกระดับการทอผ้าจากจังหวัดศรีสะเกษในการพัฒนาผ้าศรีลาวา
การพัฒนาผ้าทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ อัตลักษณ์ศรีสะเกษ ผ้าศรีลาวา ใช้ดินในพื้นที่ดินภูเขาไฟในการย้อมสีผ้า
เกิดสินค้า OTOP ที่ทำได้ตลอดปี ไม่จำกัดฤดูกาล สร้างรายได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชน
ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง
โดยคณะทำงานฯ ได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มปลูกหม่อนไหมบ้านไฮที่ต้องการ
การสนับสนุนจากภาครัฐในหลายด้าน เช่น การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อไป ในการนี้ คณะทำงานฯ
ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณต่อไป



สรุปผลการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

กำหนดการ

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ก่อนการดำเนินการ
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะทำงานฯ ออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ไปยังอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อบ.๓๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข
๒๐๒ - บ้านนาเจริญ อำเภอเขมราฐ,นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นช่วง ๆ
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๙.๕๙๓ กิโลเมตร
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ติดตามผลการดำเนินโครงการ ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ ดังนี้

๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ - บ้านปากลา
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม พัฒนาถนนเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว จากอำเภอโขงเจียม - อำเภอโพธิ์ไทร
ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตอนหนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.๗๖+๑๗๔ - กม.๗๘+๖๖๖
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๔๙๒ กิโลเมตร
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒

เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ หน่วยดำเนินการ : สนง.เกษตรจังหวัด , สนง.ประมง จังหวัด , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	๑๓,๖๗๗,๒๘๐	-	๑๓,๖๗๗,๒๘๐	
๒	โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สินค้าเกษตรแปรรูป หน่วยดำเนินการ : สนง.เกษตรจังหวัด	๒,๓๔๖,๑๐๐	-	๒,๓๔๖,๑๐๐	
๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุน ของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน หน่วยดำเนินการ : สนง.พาณิชย์จังหวัด	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว หน่วยดำเนินการ : สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	๕,๒๖๑,๕๕๐	-	๕,๒๖๑,๕๕๐	
๕	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรม ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย บนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอนอุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.๑๓+๘๕๐ - กม.๑๔+๘๕๐ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ๑ แห่ง หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ - บ้านปากลา อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕.๒๗๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี	๕๖,๐๐๐,๐๐๐	-	๕๖,๐๐๐,๐๐๐	
๗	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ หน่วยดำเนินการ : สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	๘๒๐,๑๕๐	-	๘๒๐,๑๕๐	
๘	โครงการซ่อมแซมศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยดำเนินการ : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับสังคมสูงอายุ หน่วยดำเนินการ : สนง.แรงงานจังหวัดและสถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี	๒,๔๐๔,๐๗๕	-	๒,๔๐๔,๐๗๕	
๑๐	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ หน่วยดำเนินการ : สนง.อุบลราชธานี	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	
	รวม	๑๑๔,๐๐๙,๑๕๕	-	๑๑๔,๐๐๙,๑๕๕	

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี)
ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ กันเงินไว้เบิก เหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๑๓,๐๑๔,๔๐๐	๑๐,๘๔๕,๗๐๐	๒,๑๖๘,๗๐๐	
๒	โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป	๒,๔๔๑,๙๕๐	๔๔๗,๙๕๐	๑,๙๙๔,๐๐๐	
	รวม	๑๕,๔๕๖,๓๕๐	๑๑,๒๙๓,๖๕๐	๔,๑๖๒,๗๐๐	

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ
ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ

๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อบ.๓๐๒๑

แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ - บ้านนาเจริญ อำเภอเขมราฐ,นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นช่วง ๆ
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๙.๕๙๓ กิโลเมตร
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี



จากการนิเทศติดตามฯ พบว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผิวจราจรและไหล่ทางกว้าง
มีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าขอบทางเกิดความชำรุดเสียหายเล็กน้อย
ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้แนะนำให้หน่วยดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างเข้าแก้ไขความชำรุดเสียหายดังกล่าวให้
เรียบร้อยต่อไป


๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ - บ้านปากลา

อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

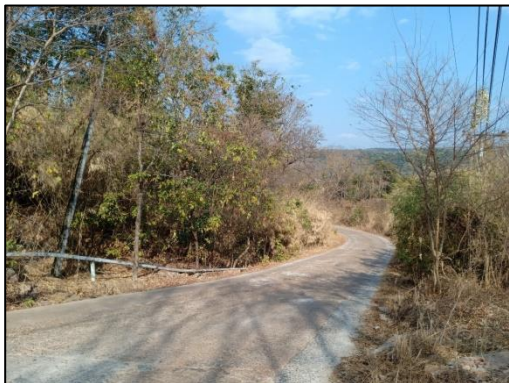

หน่วยดำเนินการได้นำคณะทำงานฯ สํารวจพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการฯ ในการนี้ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเสี่ยงในเส้นทางที่จะดำเนินโครงการฯ ซึ่งคณะทำงานฯ และหน่วยดำเนินการได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางและความเป็นไปได้ในการแก้ไขจุดเสี่ยงดังกล่าวก่อนการดำเนินโครงการฯ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าหน่วยดำเนินการจะนำปัญหาจุดเสี่ยงดังกล่าวไปพิจารณาแก้ไขเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด

๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม พัฒนาก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว จากอำเภอโขงเจียม - อำเภอโพธิ์ไทร

ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตอนหนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.๗๖+๑๗๔ - กม.๗๘+๖๖๖

จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒.๔๙๒ กิโลเมตร

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒



จากการนิเทศติดตามฯ พบว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝัวจราจรและไหล่ทางกว้าง การสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย อันจะเป็นการรองรับปริมาณการจราจรในเส้นทาง การท่องเที่ยวในพื้นที่ ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้แนะนำให้หน่วยดำเนินการจัดให้มีการประเมินประสิทธิผล และผลลัพธ์ของโครงการ โดยอาจนำจำนวนนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ในเส้นทางดังกล่าวมาเป็นประเด็นในการประเมินด้วย



สรุปผลการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ณ พื้นที่จังหวัดขุขันธ์
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

กำหนดการ

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ก่อนการดำเนินการ
ณ จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

- เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะทำงานฯ เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ไปยังศาลากลางจังหวัดยโสธร
- เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ
ณ ห้องประชุมแดงโมหาวาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
- เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ น. ติดตามผลการดำเนินโครงการ ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอนโรงพยาบาลยโสธร - ดอนมะยาง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๗๓๒
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงยโสธร
๒. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
กิจกรรม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ ๑,๕๓๓,๓๕๐ บาท
หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
- เวลา ๑๗.๓๐ น. - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ หน่วยดำเนินการ : สนง.เกษตรจังหวัด , สนง.ประมง จังหวัด , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	๔,๑๐๑,๖๔๐	-	๔,๑๐๑,๖๔๐	
๒	โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สินค้าเกษตรแปรรูป หน่วยดำเนินการ : สนง.เกษตรจังหวัด	๓๖๒,๔๐๐	-	๓๖๒,๔๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ หน่วยดำเนินการ : สนง.พาณิชย์จังหวัด	๖๑๐,๐๐๐	-	๖๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว หน่วยดำเนินการ : สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	๑,๕๓๓,๓๕๐	-	๑,๕๓๓,๓๕๐	
๕	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบ คมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอนบ้านย่อ - บ้านสวน (บ้านคางแคนใหญ่) ระหว่าง กม. ๒๑๔ + ๔๖๐ - กม. ๒๑๗+๗๙๕ (เป็นช่วง ๆ) หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงยโสธร	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ หน่วยดำเนินการ : สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	๒๒๗,๐๐๐	๑๒๘,๓๐๐	๙๘,๗๐๐	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับสังคมสูงอายุ หน่วยดำเนินการ : สนง.แรงงานจังหวัดและสถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร	๑,๑๕๑,๑๗๕	๒๐๒,๕๐๐	๙๔๘,๖๗๕	
๘	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ หน่วยดำเนินการ : สนง.ยโสธร	๕๐๐,๐๐๐	๑๑๑,๒๐๐	๓๘๘,๘๐๐	
	รวม	๕๘,๔๘๕,๕๖๕	๔๔๒,๐๐๐	๕๘,๐๔๓,๕๖๕	

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี)
ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่กัน เงินไว้เบิกเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๑,๕๓๓,๑๐๐	๑,๓๖๙,๓๐๐	๑๖๔,๘๐๐	
๒	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนโรงพยาบาลยโสธร - ตอนมะเขาย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๗๓๒	๓๖,๕๕๐,๐๐๐	๙,๐๑๒,๖๐๘.๓๘	๒๗,๕๓๗,๓๙๑.๖๒	
	รวม	๓๘,๐๘๓,๑๐๐	๑๐,๓๘๑,๙๐๘.๓๘	๒๗,๗๐๑,๖๙๑.๖๒	

การประชุมนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ

ณ ห้องประชุมแดงโมหวน ศาลากลางจังหวัดยโสธร




คณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ห้องประชุมแดงโมหวน ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ที่ได้กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี) พบว่า โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในช่วงการเริ่มต้นดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณจึงยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายสำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแผนดำเนินกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๓ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนโรงพยาบาลยโสธร - ดอนมะยาง ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม.๑ + ๗๓๒ การดำเนินการมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นการขอเบิกเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปีให้ทันภายในกำหนดเวลาที่ขอเบิกเงินไว้เบิก หากมีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน ซึ่งในกรณีนี้ได้กำชับให้สำนักงานจังหวัดได้กำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือในปีโดยเคร่งครัด และกำชับให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมถึงกำชับให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินโครงการทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จด้วย

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ
ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอนโรงพยาบาลโสธร - ดอนมะยาง ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม.๑ + ๗๓๒
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงโสธร

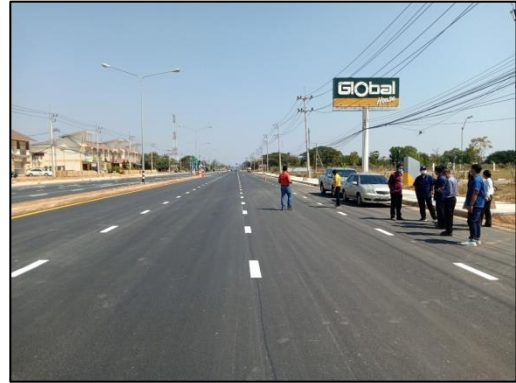

จากการนิเทศติดตามฯ พบว่า โครงการดังกล่าว มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ คือ การเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ดำเนินการ (ไฟฟ้า และประปา) ซึ่งสำนักงานจังหวัดยโสธรและแขวงทางหลวงยโสธรได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาลักษณะดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ส่งผลให้การดำเนินการมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ในกรณีนี้ คณะทำงานฯ ได้กำชับให้หน่วยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นการขอเบิกเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้ง แนะนำให้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้วย



สรุปผลการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ณ พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

กำหนดการ

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ก่อนการดำเนินการ

ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

- เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะทำงานฯ เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ไปยังพื้นที่ดำเนินโครงการฯ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรม ขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง ๒๖+๓๒๔ - กม.๓๖+๓๒๔ (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๑๐ กม. งบประมาณ ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
- เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
- เวลา ๑๗.๓๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ หน่วยดำเนินการ : สนง.เกษตรจังหวัด , สนง.ประมง จังหวัด , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	๔,๓๖๘,๘๗๒	-	๔,๓๖๘,๘๗๒	
๒	โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สินค้าเกษตรแปรรูป หน่วยดำเนินการ : สนง.เกษตรจังหวัด	๑๙๘,๐๐๐	-	๑๙๘,๐๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ หน่วยดำเนินการ : สนง.พาณิชย์จังหวัด	๑,๘๕๖,๖๐๐	-	๑,๘๕๖,๖๐๐	
๔	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยง โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ -กิจกรรมขยายไหล่ทางทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชมื่น - น้ำปลีก ระหว่าง ๒๖+๓๒๔ - กม.๓๖+๓๒๔ (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๑๐ กม.	๕๔,๐๐๐,๐๐๐	-	๕๔,๐๐๐,๐๐๐	
๕	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว หน่วยดำเนินการ : สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	๑,๓๔๑,๒๕๐	-	๑,๓๔๑,๒๕๐	
๖	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ หน่วยดำเนินการ : สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	๒๒๗,๐๐๐	-	๒๒๗,๐๐๐	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับสังคมสูงอายุ หน่วยดำเนินการ : สนง.แรงงานจังหวัดและสถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ	๙๒๓,๓๗๕	-	๙๒๓,๓๗๕	
๘	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ หน่วยดำเนินการ : สนง.อำนาจเจริญ	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	
	รวม	๖๓,๓๑๕,๐๙๗	-	๖๓,๓๑๕,๐๙๗	

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี)
ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่กัน เงินไว้เบิกเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	๙๖๕,๐๐๐	๙๔๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป	๓๖๐,๐๐๐	-	๓๖๐,๐๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	๑,๖๙๕,๖๘๐	-	๑,๖๙๕,๖๘๐	
รวม		๓,๐๒๐,๖๘๐	๙๔๕,๐๐๐	๒,๐๗๕,๖๘๐	

การนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ
ณ พื้นที่ดำเนินโครงการ

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม ขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนขมิ้น - น้ำปลี
ระหว่าง ๒๖+๓๒๔ - กม.๓๖+๓๒๔ (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง ๑๐ กม.

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ



จากการนิเทศติดตามฯ พบว่า ทางหลวงสายดังกล่าวมีปริมาณการจราจรค่อนข้างสูง มีการสัญจรของรถทุกชนิด โดยเฉพาะรถบรรทุกอ้อย ซึ่งมีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่บริเวณทางหลวงสายดังกล่าว สภาพผิวทางชำรุดไหล่ทางแคบ จึงมีความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการขยายไหล่ทาง เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้กำชับให้หน่วยดำเนินการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้

การประชุมนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ
ณ ห้องประชุมพระมงกุฎมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ



คณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ห้องประชุมพระมงกุฎมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ที่ได้กักเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี) พบว่า โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในช่วงการเริ่มต้นดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณจึงยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายสำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้กักเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแผนดำเนินการกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๓ โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ ๔

ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นการขอเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปีให้ทันภายในกำหนดเวลาที่ขอเงินไว้เบิก หากมีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ต้องขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน ซึ่งในกรณีนี้ได้กำชับให้สำนักงานจังหวัดได้กำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการขอเงินไว้เบิกเหลือในปีโดยเคร่งครัด และกำชับให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมถึงกำชับให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินโครงการทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จด้วย

תרגום



คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ที่ ๑๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการทำงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการทำงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ และคำสั่งที่ ๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการทำงานโครงการตามแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ นั้น

เพื่อให้การติดตามเร่งรัดและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๖) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงยกเลิกคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ที่ ๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และคำสั่ง ที่ ๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดและประเมินผลการทำงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านเศรษฐกิจ) | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓. รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร | รองประธานคณะทำงาน |
| ๔. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ | รองประธานคณะทำงาน |
| ๕. คลังจังหวัดอุบลราชธานี | คณะทำงาน |
| ๖. พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี | คณะทำงาน |
| ๗. เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี | คณะทำงาน |
| ๘. พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี | คณะทำงาน |
| ๙. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี | คณะทำงาน |
| ๑๐. อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี | คณะทำงาน |

/๑๑. หัวหน้าผู้ตรวจสอบ....

- | | |
|---|-----------------------------|
| ๑๑. หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี | คณะทำงาน |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุบลราชธานี | คณะทำงาน |
| ๑๓. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี | คณะทำงาน |
| ๑๔. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๑๕. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. กำกับและติดตามการบริหารโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ
๒. ประสานส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ
๓. ออกตรวจติดตาม ประเมินคุณภาพของแผนงาน/โครงการ ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ
๔. นำเสนอผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลต่อหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้าน เพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการตามความเหมาะสม
๖. ประเมินคุณภาพของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๗. ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
